

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月31日

計画の名称	安全で安心して暮らせる住みよいまち田布施町の実現（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成34年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	田布施町												
計画の目標	多発する集中豪雨等による浸水被害を低減させる。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	700	A	700	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (H34末)
1	中央排水区の浸水対策達成率（10年確率）を5.3%（H30）から10.1%（H34）に増加させる。 中央排水区の浸水対策達成率 浸水対策完了済面積（ha）/排水区面積（ha）	53%	%	101%
2	平田川排水区の浸水対策達成率（10年確率）を0%（H30）から0.4%（H34）に増加させる。 平田川排水区の浸水対策達成率 浸水対策完了済面積（ha）/排水区面積（ha）	0%	%	4%
3	浜城排水区の浸水対策達成率（10年確率）を50.6%（H30）から61.1%（H34）に増加させる。 浜城排水区の浸水対策達成率 浸水対策完了済面積（ha）/排水区面積（ha）	506%	%	611%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
山口県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-001~A07-006												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	田布施町	直接	田布施町	管渠(雨水)	新設	雨水管渠整備事業(中央排水区他)	幹線 0.4km	田布施町						400	-	
	A07-002	下水道	一般	田布施町	直接	田布施町	管渠(雨水)	新設	雨水管渠整備事業(中央排水区他)	調査・詳細設計等	田布施町						30	-	
	A07-003	下水道	一般	田布施町	直接	田布施町	管渠(雨水)	新設	雨水管渠整備事業(平田川排水区)	幹線 0.1km	田布施町						118	-	
	A07-004	下水道	一般	田布施町	直接	田布施町	管渠(雨水)	新設	雨水管渠整備事業(平田川排水区)	調査・詳細設計等	田布施町						53	-	
	A07-005	下水道	一般	田布施町	直接	田布施町	管渠(雨水)	新設	雨水管渠整備事業(浜城排水区)	枝線 3.5ha	田布施町						92	-	
	A07-006	下水道	一般	田布施町	直接	田布施町	管渠(雨水)	新設	雨水管渠整備事業(浜城排水区)	調査・詳細設計等	田布施町						7	-	
												小計						700	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
田布施町、社会資本総合整備計画評価実施要綱に基づき、事後評価委員会を設置し、事後評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	田布施町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	浸水対策重点地区である中央排水区・平田川排水区・浜城排水区の浸水対策を実施することによって、浸水被害の軽減につながり、安心・安全な暮らしができるまちの実現が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き浸水対策を実施することにより、浸水被害の軽減を目指す。	


目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	101%
	最終実績値	108%
2	最終目標値	4%
	最終実績値	8%
3	最終目標値	611%
	最終実績値	509%

計画的に浸水対策事業を実施し、目標を達成した。

計画的に浸水対策事業を実施し、目標を達成した。

他地区を優先したため、目標値達成に至らなかった。

参考図面 (防災・安全交付金)

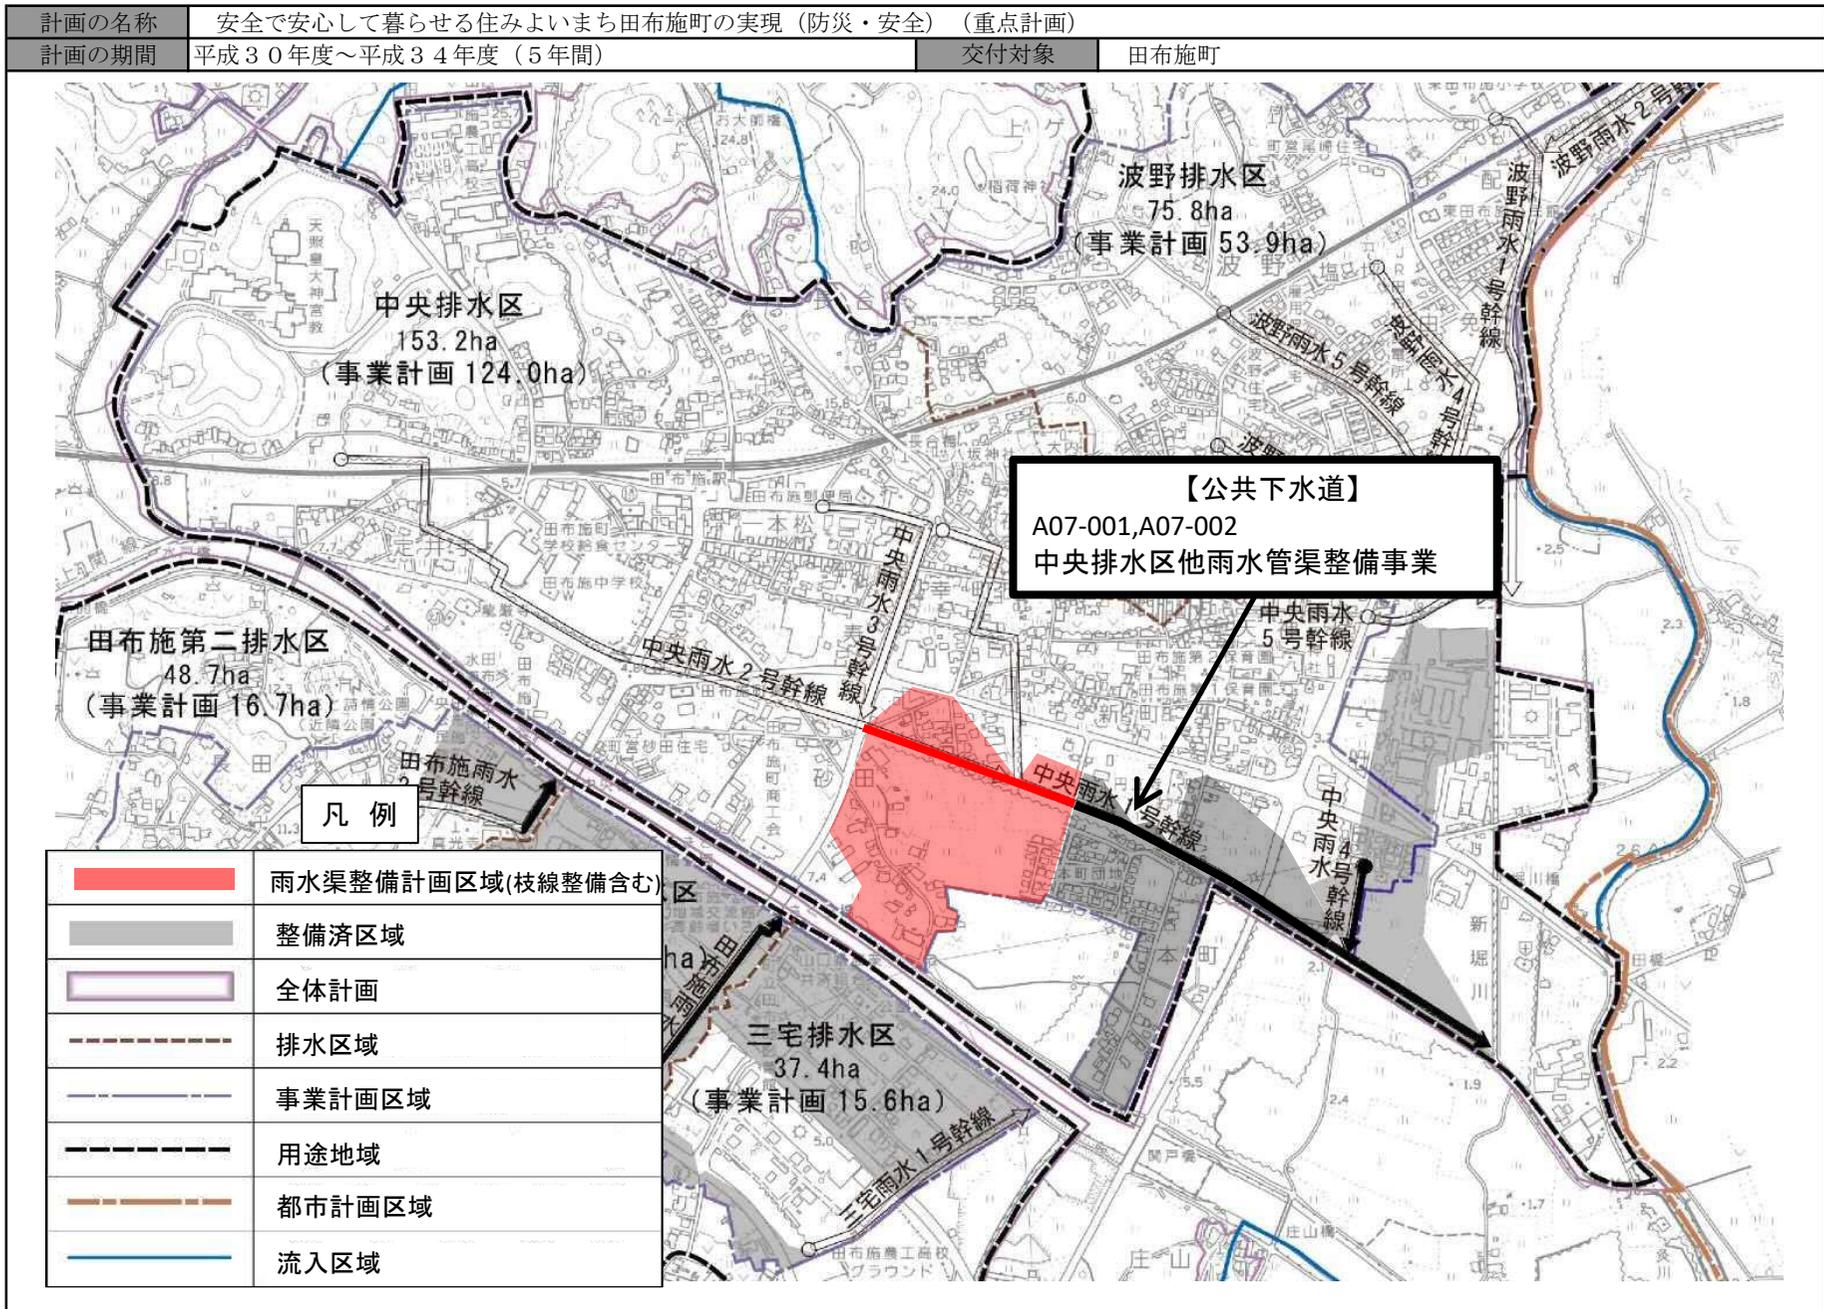

参考図面 (防災・安全交付金)

